



**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**

Ebene_1-Bericht: Rückbaumsetzung

Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft

Version: Endbericht

Druckdatum: 08.10.2019

Hinweis:

Der gegenständige Druckbericht stellt einen automatisierten Auszug aus dem Prozessmodell des Lehr- und Forschungsgebietes für Baubetrieb und Bauwirtschaft dar. Weitere Abfragen und Sichten auf das Modell können auf Nachfrage angefertigt werden.




Inhaltsverzeichnis

1	Rückbaumsetzung.....	4
1.1	Rückbauausführung einleiten.....	4
1.1.1	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen.....	14
1.1.1.a	Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) erfassen.....	16
1.1.1.b	Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen.....	18
1.1.1.c	Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) erstellen.....	19
1.1.1.d	Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen.....	20
1.1.1.e	Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfassen.....	21
1.2	Rückbauausführung (Schadstoffe) umsetzen.....	23
1.2.1	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen.....	35
1.2.1.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen.....	37
1.2.1.b	Bauvorhabendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen	39
1.2.1.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erstellen.....	40
1.2.1.d	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen.....	42
1.2.1.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen	44
1.2.2	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen.....	47
1.2.2.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen.....	49
1.2.2.b	Bauvorhabendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen.....	51
1.2.2.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen.....	52
1.2.2.d	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen.....	54
1.2.2.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen	56
1.2.3	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen.....	59
1.2.3.a	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen.....	61
1.2.3.b	Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	63
1.2.3.c	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	65
1.2.3.d	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	68
1.2.4	Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten.....	70
1.2.4.a	Begleitschein Rahmendaten eintragen.....	71
1.2.4.b	Abfallerzeugerdaten eintragen.....	72
1.2.4.c	Abfallbeförderer eintragen.....	74
1.2.4.d	Abfallentsorgerdaten eintragen.....	76
1.2.5	Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen.....	78
1.2.5.a	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen.....	80
1.2.5.b	Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	82
1.2.5.c	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	84
1.2.5.d	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	86
1.2.5.e	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen.....	87
1.3	Rückbauausführung (Schadstoffe) fertigstellen.....	88
1.4	Rückbauausführung (Entkernung) umsetzen.....	93
1.4.1	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen.....	104
1.4.1.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen.....	106
1.4.1.b	Bauvorhabendaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen.....	108
1.4.1.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung) erstellen.....	109
1.4.1.d	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen.....	111
1.4.1.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen.....	113
1.4.2	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen.....	116
1.4.2.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen.....	118
1.4.2.b	Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen.....	120
1.4.2.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung) erstellen.....	121
1.4.2.d	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen.....	123
1.4.2.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen.....	125
1.4.3	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen.....	128
1.4.3.a	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen.....	130
1.4.3.b	Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	132




1.4.3.c	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	134
1.4.3.d	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	137
1.4.4	Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen.....	139
1.4.4.a	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen.....	141
1.4.4.b	Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	143
1.4.4.c	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	145
1.4.4.d	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	147
1.4.4.e	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen.....	148
1.5	Rückbauausführung (Entkernung) fertigstellen.....	149
1.6	Rückbauausführung (Abbruch) umsetzen.....	154
1.6.1	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen.....	165
1.6.1.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen.....	167
1.6.1.b	Bauvorhabendaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen.....	169
1.6.1.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch) erstellen.....	170
1.6.1.d	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen.....	172
1.6.1.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen.....	174
1.6.2	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen.....	177
1.6.2.a	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau) erfassen.....	179
1.6.2.b	Bauvorhabendaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen.....	181
1.6.2.c	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch) erstellen.....	182
1.6.2.d	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen.....	184
1.6.2.e	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen.....	186
1.6.3	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen.....	189
1.6.3.a	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen.....	191
1.6.3.b	Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	193
1.6.3.c	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	195
1.6.3.d	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	198
1.6.4	Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen.....	200
1.6.4.a	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen.....	202
1.6.4.b	Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	204
1.6.4.c	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	206
1.6.4.d	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	208
1.6.4.e	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen.....	209
1.7	Rückbauausführung (Abbruch) fertigstellen.....	210

1 Rückbauumsetzung



1.1 Rückbauausführung einleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau QM-Plan	1. Bearbeitung	Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
	Rückbau Baustellenorganigramm	1. Bearbeitung	Baustellenorganigramm (Rückbau) erstellen
	Abbruchgenehmigung	Genehmigt	Abbruchgenehmigung erteilen
	Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung)	1. Bearbeitung	Bestandsaufnahme IST-Gebäude durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau- und Entsorgungskonzept	1. Bearbeitung	Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellen
	Nachweis (Rest-) Standsicherheit	1. Bearbeitung	Nachweis der (Rest-) Standsicherheit erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Vertragserfüllungsbürgschaft mit AS an AG	Geteilt	Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau) an BH versenden
	Protokoll Rückbau Startgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch (Rückbau) führen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Projektstrukturplan fein	1. Bearbeitung	Projektstrukturplan (Rückbau) feingliedern
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	Rückbauprojekt spezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressourcen (Rückbau) disponieren
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Fachbauleitererklärung (Rückbau) abgeben	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Auftrag Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
Kostencontrolling (Rückbau) fortführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Termincontrolling (Rückbau) fortführen	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Rückbauprojekt spezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressourcen (Rückbau) disponieren
	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
Bestellung (Rückbau) abrufen	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbauprojekt spezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressourcen (Rückbau) disponieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Fachbauleitererklärung (Rückbau) abgeben <input type="checkbox"/> Kostencontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau) <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Schlussrechnung (Rückbau) stellen <input type="checkbox"/> Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau) zurückfordern <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> bruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Fachbauleitererklärung (Rückbau) abgeben	Fachbauleitererklärung (Rückbau)	Geteilt	-
Kostencontrolling (Rückbau) fortführen	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Termincontrolling (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> ben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Termincontrolling (Rückbau) fortführen	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen <input type="checkbox"/> Detailterminplan (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau) <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen <input type="checkbox"/> Bauleitung durchführen <input type="checkbox"/> Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit erstellen <input type="checkbox"/> Bestellung (Rückbau) abrufen
Bestellung (Rückbau) abrufen	Bestellung (Rückbau)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen

1.1.1 Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) erfassen			
Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) erstellen			
Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off)		-
Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen	Bauvorhabendaten (Kick-Off)		-
Besprechungsrahmendaten (Kick-Off)	Besprechungsrahmendaten (Kick-Off)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
erstellen			
Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen	Teilnehmerdaten (Kick-Off)		-
Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfassen	Protokollaufbaudaten (Kick-Off)		-

1.1.1.a Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau)	Abbruchunternehmername (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Abbruchunternehmerort (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer	Abbruchunternehmertelefonnummer	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
(Rückbau)	(Rückbau)		
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.b Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.c Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungs-ort Kick-Off (Rückbau)			
Besprechungsdatum Kick-Off (Rückbau)			
Besprechungszeitraum Kick-Off (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungs-ort Kick-Off (Rückbau)	Besprechungs-ort Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Besprechungsdatum Kick-Off (Rückbau)	Besprechungsdatum Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum Kick-Off (Rückbau)	Besprechungszeitraum Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-


1.1.1.d Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername Kick-Off (Rückbau)			
Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau)			
Protokollverteilungsart Kick-Off (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername Kick-Off (Rückbau)	Teilnehmername Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau)	Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart Kick-Off (Rückbau)	Protokollverteilungsart Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-

1.1.1.e Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufende Nummer Protokollposition Kick-Off (Rückbau)			
Einzelthema Kick-Off (Rückbau)			
Protokollbesprechungstext Kick-Off (Rückbau)			
Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rückbau)			
Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rückbau)			
Terminangabe Kick-Off (Rückbau)			
Übergaben Kick-Off (Rückbau)			
Sonstiges Kick-Off (Rückbau)			
Protokollerstelldatum Kick-Off (Rückbau)			
Protokollführender Kick-Off (Rückbau)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufende Nummer Protokollposition Kick-Off (Rückbau)	Laufende Nummer Protokollposition Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Einzelthema Kick-Off (Rückbau)	Einzelthema Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext Kick-Off (Rückbau)	Protokollbesprechungstext Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rückbau)	Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rückbau)	Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Terminangabe Kick-Off (Rückbau)	Terminangabe Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Übergaben Kick-Off (Rückbau)	Übergaben Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Sonstiges Kick-Off (Rückbau)	Sonstiges Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Protokollerstelldatum Kick-Off (Rückbau)	Protokollerstelldatum Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-
Protokollführender Kick-Off (Rückbau)	Protokollführender Kick-Off (Rückbau)	Freigegeben	-

1.2 Rückbauausführung (Schadstoffe) umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Bestellung (Rückbau)	1. Bearbeitung	Bestellung (Rückbau) abrufen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Bestellung (Rückbau)	1. Bearbeitung	Bestellung (Rückbau) abrufen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	(Schadstoffe)		stoffe) intern durchführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Lieferschein Beseitigung	Geteilt	Warenannahmeprotokoll Beseitigung erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen <input type="checkbox"/> Baubesprechungen (Rückbau)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Schadstoffe) intern durchführen <input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen	Lieferschein intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen <input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen <input type="checkbox"/> Leistungen ausführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Betriebsanweisung erstellen
Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgung prüfen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	<input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren <input type="checkbox"/> Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen <input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren
Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Begleitgutachten Schadstoffe erstellen <input type="checkbox"/> Fotodokumentation erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagesberichte (Rückbau) freigeben <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen

1.2.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe)		-
Bauvorhabendaten (Besprechung ex-	Bauvorhabendaten (Besprechung ex-		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
tern Schadstoffe) erfassen	tern Schadstoffe)		
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe)		-
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe)		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe)		-

1.2.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-


1.2.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungs-ort (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungs-ort (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Besprechungs-ort (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-

1.2.1.d Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Protollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Protkollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Protkollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-

1.2.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) extern			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern			
Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Protokollerstelldatum (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) extern	Freigegeben	-

1.2.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen		-
Bauvorhabendaten (Besprechung intern)	Bauvorhabendaten (Besprechung intern)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Schadstoffe) erfassen	Schadstoffe) erfassen		
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen		-
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen		-

1.2.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmermertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-


1.2.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungsort (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungsort (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Besprechungsort (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Besprechungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-

1.2.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Teilnehmername (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollverteilungsart (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-

1.2.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollnummer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Verweis auf zurückliegende Protokoll (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Protokollergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Protokollerstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			
Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollnummer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollnummer (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokoll (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Verweis auf zurückliegende Protokoll (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Protokollergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollergebnis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Protokollerstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollerstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Protokollführender (Rückbau) (Schadstoffe) (intern)	Freigegeben	-

1.2.3 Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen			
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)		-
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)		-
	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)		-
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)		-

1.2.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmenort (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Abbruchunternehmen E-mail (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmen E-mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Schadstoffe)			
Poliername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Baustellenname (Rückbau)			
Baustellenstraße (Rückbau)			
Baustellenort (Rückbau)			
Witterung Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)			
Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Schadstoffe)	Leistungsberichtsnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Poliername (Rückbau) (Schadstoffe)	Poliername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Baustellenname (Rückbau)	Baustellenname (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenstraße (Rückbau)	Baustellenstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Baustellenort (Rückbau)	Baustellenort (Rückbau)	Freigegeben	-
Witterung Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Witterung Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)	Temperatur Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

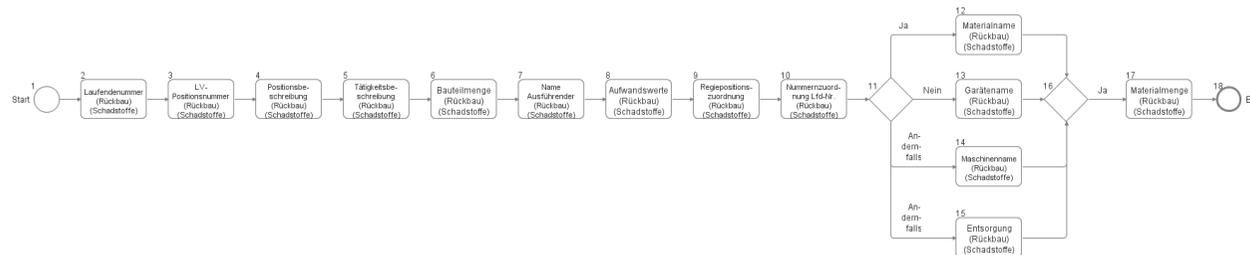


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufendenummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe)			
Name Ausführender (Rückbau) (Schadstoffe)			
Aufwandswerte (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Schadstoffe)			
Materialname (Rückbau) (Schadstoffe)			
Gerätename (Rückbau) (Schadstoffe)			
Maschinename (Rückbau) (Schadstoffe)			
Entsorgung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufendenummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Laufendenummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	LV-Positionsnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Positionsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe)	Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Name Ausführer (Rückbau) (Schadstoffe)	Name Ausführer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufandswerte (Rückbau) (Schadstoffe)	Aufandswerte (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Schadstoffe)	Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Materialname (Rückbau) (Schadstoffe)	Materialname (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Gerätename (Rückbau) (Schadstoffe)	Gerätename (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Maschinename (Rückbau) (Schadstoffe)	Maschinename (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Entsorgung (Rückbau) (Schadstoffe)	Entsorgungsname	Freigegeben	-
Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe)	Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)			
Datum (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Datum (Rückbau) (Schadstoffe)	Datum	Freigegeben	-
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Schadstoffe)	Unterschrift Berichtersteller	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Schadstoffe)	Unterschrift Auftraggeber	Freigegeben	-


1.2.4 Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Begleitschein Rahmendaten eintragen			
Abfallerzeugerdaten eintragen			
Abfallbeförderer eintragen			
Abfallentsorgerdaten eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Begleitschein Rahmendaten eintragen	Begleitschein Rahmendaten	endgültig	-
Abfallerzeugerdaten eintragen	Abfallerzeugerdaten	endgültig	-
Abfallbeförderer eintragen	Abfallbefördererdaten	endgültig	-
Abfallentsorgerdaten eintragen	Abfallentsorgerdaten	endgültig	-


1.2.4.a Begleitschein Rahmendaten eintragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallbezeichnung Begleitschein eintragen			
Prüfziffer eintragen			
Übernahmeschein-Nummern eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abfallbezeichnung Begleitschein eintragen	Abfallbezeichnung Begleitschein	endgültig	-
Prüfziffer eintragen	Prüfziffer Begleitschein	endgültig	-
Übernahmeschein-Nummern eintragen	Übernahmeschein-Nummern	endgültig	-

1.2.4.b Abfallerzeugerdaten eintragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallerzeugername angeben			
Abfallerzeuger Straße eintragen			
Abfallerzeuger Ort eintragen			
Abfallschlüssel Begleitschein eingeben			
Erzeugernummer eintragen			
Datum der Übergabe Begleitschein eintragen			
Quittungsbelegstatus eintragen			
Unterschriftname Abfallerzeuger eintragen			
Unterschriftdatum Abfallerzeuger eintragen			
Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Abfallerzeugername angeben	Abfallerzeugername	endgültig	-
Abfallerzeuger Straße eintragen	Abfallerzeuger Straße	endgültig	-
Abfallerzeuger Ort eintragen	Abfallerzeuger Ort	endgültig	-
Abfallschlüssel Begleitschein eingeben	Outputobjekt E5	endgültig	-
Erzeugernummer eintragen	Erzeugernummer Begleitschein	endgültig	-
Datum der Übergabe Begleitschein eintragen	Datum der Übergabe Begleitschein	endgültig	-
Quittungsbelegstatus eintragen	Quittungsbelegstatus	endgültig	-
Unterschriftname Abfallerzeuger eintragen	Unterschriftname Abfallerzeuger	endgültig	-
Unterschriftdatum Abfallerzeuger eintragen	Unterschriftdatum Abfallerzeuger	endgültig	-
Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger eintragen	Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger	endgültig	-

1.2.4.c Abfallbeförderer eintragen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallbeförderername eintragen			
Abfallbeförderer Straße eintragen			
Abfallbeförderer Ort eintragen			
Entsorgungsnachweisnummer eintragen			
Beförderernummer eintragen			
Datum der Übernahme eintragen			
KFZ-Kennzeichen Zugmaschine eintragen			
KFZ-Kennzeichen Auflieger eintragen			
Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer eintragen			
Unterschriftenname Abfallbeförderer eintragen			
Unterschriftendatum Abfallbeförderer eintragen			
Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer eintragen			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Abfallbeförderername eintragen	Abfallbeförderername	endgültig	-
Abfallbeförderer Straße eintragen	Abfallbeförderer Straße	endgültig	-
Abfallbeförderer Ort eintragen	Abfallbeförderer Ort	endgültig	-
Entsorgungs-Nachweis-Nummer eintragen	Entsorgungs-Nachweis-Nummer	endgültig	-
Befördernummer eintragen	Befördernummer	endgültig	-
Datum der Übernahme eintragen	Datum der Übernahme	endgültig	-
KFZ-Kennzeichen Zugmaschine eintragen	KFZ-Kennzeichen Zugmaschine	endgültig	-
KFZ-Kennzeichen Auflieger eintragen	KFZ-Kennzeichen Auflieger	endgültig	-
Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer eintragen	Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer	endgültig	-
Unterschriftenname Abfallbeförderer eintragen	Unterschriftenname Abfallbeförderer	endgültig	-
Unterschriftendatum Abfallbeförderer eintragen	Unterschriftendatum Abfallbeförderer	endgültig	-
Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer eintragen	Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer	endgültig	-

1.2.4.d Abfallentsorgerdaten eintragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abfallentsorgername eintragen			
Abfallentsorger Straße eintragen			
Abfallentsorger Ort eintragen			
Abfallmenge eintragen			
Abfallmengeneinheit eintragen			
Entsorgernummer eintragen			
Datum der Annahme eintragen			
Annahmestatus festlegen			
Quittungsbelegstatus Annahme eintragen			
Unterschriftname Abfallentsorger eintragen			
Unterschriftdatum Abfallentsorger eintragen			
Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger eintragen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Abfallentsorgername eintragen	Abfallentsorgername	endgültig	-
Abfallentsorger Straße eintragen	Abfallentsorger Straße	endgültig	-
Abfallentsorter Ort eintragen	Abfallentsorter Ort	endgültig	-
Abfallmenge eintragen	Abfallmenge	endgültig	-
Abfallmengeneinheit eintragen	Abfallmengeneinheit	endgültig	-
Entsorgernummer eintragen	Entsorgernummer	endgültig	-
Datum der Annahme eintragen	Datum der Annahme	endgültig	-
Annahmestatus festlegen	Annahmestatus	endgültig	-
Quittungsbelegstatus Annahme eintragen	Quittungsbelegstatus Annahme	endgültig	-
Unterschriftname Abfallentsorger eintragen	Unterschriftname Abfallentsorger	endgültig	-
Unterschriftdatum Abfallentsorger eintragen	Unterschriftdatum Abfallentsorger	endgültig	-
Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger eintragen	Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger	endgültig	-

1.2.5 Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen			
Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe)		-
Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
bau) (Schadstoffe) erfassen	bau) (Schadstoffe)		
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe)		-
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe)		-
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe)		-

1.2.5.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmerstraße (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Unternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmerort (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) (Schadstoffe)	Unternehmer E-Mail (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.5.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauherrenname (Rückbau)			
Objektstraße (Rückbau)			
Objektort (Rückbau)			
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Schadstoffe)			
Bautagebuch Datum (Rückbau) (Schadstoffe)			
Bautagebuch Witterung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Bautagebuch Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)			
Beteiligte Unternehmensnamen (Rückbau) (Schadstoffe)			
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Bauherrenname (Rückbau)	Bauherrenname (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektstraße (Rückbau)	Objektstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektort (Rückbau)	Objektort (Rückbau)	Freigegeben	-
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Bautagebuchnummer (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bautagebuch Datum (Rückbau) (Schadstoffe)	Bautagebuch Datum (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bautagebuch Witterung (Rückbau) (Schadstoffe)	Bautagebuch Witterung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bautagebuch Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)	Bautagebuch Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Beteiligte Unternehmensnamen (Rückbau) (Schadstoffe)	Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schadstoffe)	Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.5.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Schadstoffe)			
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schadstoffe)			
Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe)			
Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)			
Außervertragliches (Rückbau) (Schadstoffe)			
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Schadstoffe)	LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schadstoffe)	LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe)	Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe)	Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Außervertragliches (Rückbau) (Schadstoffe)	Außervertragliches (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe)	Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.2.5.d Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe)			
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe)			
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe)	Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe)	Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)	Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-


1.2.5.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe)			
Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe)			
Prüferunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe)	Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe)	Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-
Prüferunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)	Prüferunterschrift (Rückbau) (Schadstoffe)	Freigegeben	-

1.3 Rückbauausführung (Schadstoffe) fertigstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenmeldung (Rückbau) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
	Lieferschein intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen
Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau BE-Plan	1. Bearbeitung	BE-Plan (Rückbau) erstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Aufmaßprüfprotokoll	Freigegeben	Aufmaßprüfung
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Rechnungsprüfprotokoll	Freigegeben	Rechnungsprüfung
	Zahlungsanweisung (Rückbau)	Freigegeben	Zahlung anweisen
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau)	Geteilt	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen
	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen
	Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kostenmeldung (Rückbau) erstellen	Kostenmeldung (Rückbau)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Aufmaßprüfung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
len			
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfung <input type="checkbox"/> Zahlung anweisen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen	Rechnungsausgangsbuch (Rückbau)	1. Bearbeitung	-
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Abnahme durchführen <input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen
Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen	Teilabnahmeprotokoll (Rückbau) (Schadstoffe)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Abnahme durchführen <input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen

1.4 Rückbauausführung (Entkernung) umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen	Abnahmeprotokoll (Rückbau)	Freigegeben	Abnahme durchführen
	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Bestellung (Rückbau)	1. Bearbeitung	Bestellung (Rückbau) abrufen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen	
Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen	Abnahmeprotokoll (Rückbau)	Freigegeben	Abnahme durchführen
	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			menstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Arbeitskalkulation (erste)	1. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation (Rückbau) erstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
setzen			führen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	
Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Entsorgungsbestätigung (Entkernung) weiterleiten	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Lieferschein Verwertung	Geteilt	Warenannahmeprotokoll Verwertung erstellen
	Lieferschein Beseitigung	Geteilt	Warenannahmeprotokoll Beseitigung erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Entsorgungsbestätigung (Entkernung) weiterleiten
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			menstellen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Auftrag Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt (Stoffe)	Geteilt	Sicherheitsdatenblatt (Stoffe) erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	□ Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) fortführen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmittteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen	Lieferschein intern (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen <input type="checkbox"/> Leistungen ausführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Betriebsanweisung erstellen
Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgungsbestätigung (Entkernung) weiterleiten <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Entsorgungsbestätigung (Entkernung) weiterleiten	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgung prüfen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	<input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren <input type="checkbox"/> Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen <input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren
Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

1.4.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung)		-
Bauvorhabendaten (Besprechung ex-	Bauvorhabendaten (Besprechung ex-		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
tern Entkernung) erfassen	tern Entkernung)		
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung)		-
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung)		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung)		-

1.4.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmermertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-


1.4.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) extern			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) extern			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) extern	Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) extern	Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) extern	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-

1.4.1.d Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) extern			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) extern			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) extern			
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) extern	Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) extern	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) extern	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-

1.4.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) extern			
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) extern			
Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) extern			
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) extern			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) extern			
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) extern			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) extern			
Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) extern			
Übergaben (Rückbau) (Entkernung) extern			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) extern			
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) extern			
Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) extern	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) extern	Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) extern	Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) extern	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) extern	Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Übergaben (Rückbau) (Entkernung) extern	Übergaben (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) extern	Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) extern	Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) extern	Freigegeben	-

1.4.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung)		-
Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen	Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Entkernung) erfassen	Entkernung)		
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung)		-
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung)		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung)		-

1.4.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmermertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-


1.4.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) intern			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) intern			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) intern	Besprechungsort (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) intern	Besprechungsdatum (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) intern	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-

1.4.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) intern			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) intern			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) intern			
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) intern	Teilnehmername (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) intern	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) intern	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollverteilungsart (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-

1.4.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) intern			
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) intern			
Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) intern			
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) intern			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) intern			
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) intern			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) intern			
Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) intern			
Übergaben (Rückbau) (Entkernung) intern			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) intern			
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) intern			
Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollnummer (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) intern	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) intern	Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) intern	Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) intern	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) intern	Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Übergaben (Rückbau) (Entkernung) intern	Übergaben (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) intern	Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollerstelldatum (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) intern	Protokollführender (Rückbau) (Entkernung) intern	Freigegeben	-

1.4.3 Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen			
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen			
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen			
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)		-
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)		-
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)		-

1.4.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)	Abbruchunternehmername (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
(Entkernung)	(Entkernung)		
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Entkernung)			
Poliername (Rückbau) (Entkernung)			
Baustellenname (Rückbau)			
Baustellenstraße (Rückbau)			
Baustellenort (Rückbau)			
Witterung (Rückbau) (Entkernung)			
Temperatur (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Entkernung)	Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Poliername (Rückbau) (Entkernung)	Poliername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Baustellenname (Rückbau)	Baustellenname (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenstraße (Rückbau)	Baustellenstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Baustellenort (Rückbau)	Baustellenort (Rückbau)	Freigegeben	-
Witterung (Rückbau) (Entkernung)	Witterung (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Temperatur (Rückbau) (Entkernung)	Temperatur (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen

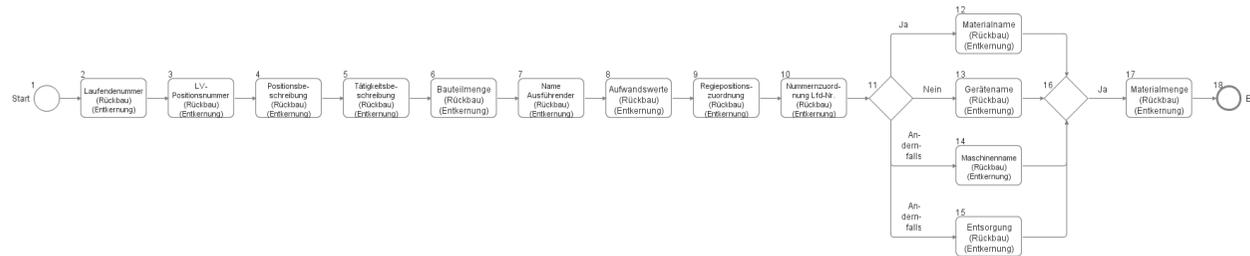


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufendenummer (Rückbau) (Entkernung)			
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)			
Bauteilmenge (Rückbau) (Entkernung)			
Name Ausführender (Rückbau) (Entkernung)			
Aufwandswerte (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Entkernung)			
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Entkernung)			
Materialname (Rückbau) (Entkernung)			
Gerätename (Rückbau) (Entkernung)			
Maschinename (Rückbau) (Entkernung)			
Entsorgung (Rückbau) (Entkernung)			
Materialmenge (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufendenummer (Rückbau) (Entkernung)			
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)			
Bauteilmenge (Rückbau) (Entkernung)			
Name Ausführender (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Aufwandswerte (Rückbau) (Entkernung)			
Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Entkernung)			
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Entkernung)	Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Materialname (Rückbau) (Entkernung)	Materialname (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Gerätename (Rückbau) (Entkernung)	Gerätename (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Maschinename (Rückbau) (Entkernung)	Maschinename (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Entsorgung (Rückbau) (Entkernung)			
Materialmenge (Rückbau) (Entkernung)	Materialmenge (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung)			
Datum (Rückbau) (Entkernung)			
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Entkernung)			
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung)	Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Datum (Rückbau) (Entkernung)	Datum (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Entkernung)	Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Entkernung)	Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.4 Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen			
Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen			
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen			
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen			
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)		-
Baustellendaten Bautagebuch (Rück-	Baustellendaten Bautagebuch (Rück-		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
bau) (Entkernung) erfassen	bau) (Entkernung)		
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)		-
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)		-
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)		-

1.4.4.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unternehmername (Rückbau) (Entkernung)			
Unternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)			
Unternehmerort (Rückbau) (Entkernung)			
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmerstraße (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmerort (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) (Entkernung)	Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.4.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauherrenname (Rückbau)			
Objektstraße (Rückbau)			
Objektort (Rückbau)			
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Entkernung)			
Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entkernung)			
Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Entkernung)			
Bautagebuchtemperereatur (Rückbau) (Entkernung)			
Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Entkernung)			
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauherrenname (Rückbau)	Bauherrenname (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektstraße (Rückbau)	Objektstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektort (Rückbau)	Objektort (Rückbau)	Freigegeben	-
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Entkernung)	Bautagebuchnummer (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entkernung)	Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Entkernung)	Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Bautagebuchtemperatur (Rückbau) (Entkernung)	Bautagebuchtemperatur (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Entkernung)	Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entkernung)	Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.4.4.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Entkernung)			
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Entkernung)			
Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung)			
Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)			
Außervertragliches (Rückbau) (Entkernung)			
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Entkernung)	LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Entkernung)	LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung)	Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung)	Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)	Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Außervertragliches (Rückbau) (Entkernung)	Außervertragliches (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Entkernung)	Sonstiges (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-


1.4.4.d Aufstellungsdaten Bautagbeuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufsteller (Rückbau) (Entkernung)			
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entkernung)			
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufsteller (Rückbau) (Entkernung)	Aufsteller (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entkernung)	Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Entkernung)	Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-


1.4.4.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfername (Rückbau) (Entkernung)			
Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung)			
Prüferunterschrift (Rückbau) (Entkernung)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfername (Rückbau) (Entkernung)	Prüfername (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung)	Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-
Prüferunterschrift (Rückbau) (Entkernung)	Prüferunterschrift (Rückbau) (Entkernung)	Freigegeben	-

1.5 Rückbauausführung (Entkernung) fertigstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Entsorgungsbestätigung (Entkernung) weiterleiten
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
	Lieferschein intern (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen
Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Entsorgungsnachweisprüfprotokoll	Freigegeben	Entsorgung prüfen
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Aufmaßprüfprotokoll	Freigegeben	Aufmaßprüfung
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) fortführen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Rechnungsprüfprotokoll	Freigegeben	Rechnungsprüfung
	Zahlungsanweisung (Rückbau)	Freigegeben	Zahlung anweisen
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau)	Geteilt	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben	Kostenmeldung (Rückbau)	2. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Aufmaß (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Aufmaßprüfung
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfung <input type="checkbox"/> Zahlung anweisen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) fortführen	Rechnungsausgangsbuch (Rückbau)	2. Bearbeitung	-
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung) erstellen	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Abnahme durchführen <input type="checkbox"/> Fotodokumentation erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen	Teilabnahmeprotokoll (Rückbau) (Entkernung)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Abnahme durchführen <input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen

1.6 Rückbauausführung (Abbruch) umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Bestellung (Rückbau)	1. Bearbeitung	Bestellung (Rückbau) abrufen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Abnahmeprotokoll (Rückbau)	Freigegeben	Abnahme durchführen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung
Bestellung (Rückbau)		1. Bearbeitung	Bestellung (Rückbau) abrufen
Terminplan (Rückbau)		1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)		Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV		1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
Rückbauverfahren		1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Geräte- und Personalverteilung (Rück-	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
bau) (Abbruch) umsetzen			(extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	bruch)		bruch) intern durchführen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV	1. Bearbeitung	Baustelle (Rückbau) besichtigen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Auftrag Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Verwertungsplanung	1. Bearbeitung	Anpassung Entsorgungskonzept
	Beseitigungsplanung	1. Bearbeitung	Verwertungs- und Beseitigungsplanung aufstellen
	Produktdatenblatt		Produktdatenblatt erstellen
	Sicherheitsdatenblatt		Sicherheitsdatenblatt erstellen
	Leistungserklärung (Stoffkreislauf)		Leistungserklärung erstellen
	Betonlieferschein		Betonlieferscheine erstellen
	Einbauprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Einbauprotokoll aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt)	1. Bearbeitung	Rückbaubeprobungsprotokoll (Bauprodukt) erstellen
	Lieferschein (Produktionsausgang)		Lieferschein Produktionsausgang erstellen
Entsorgungsbestätigung (Abbruch) weiterleiten	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Lieferschein Verwertung	Geteilt	Warenannahmeprotokoll Verwertung erstellen
	Lieferschein Beseitigung	Geteilt	Warenannahmeprotokoll Beseitigung erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Rückbau LV-Nebenleistungen (anpassen)	2. Bearbeitung	Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen
	Rückbauverfahren	1. Bearbeitung	Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Rückbau Auftrag Fremdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau) <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Schlussrechnung (Rückbau) stellen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen	Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen <input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen <input type="checkbox"/> Leistungen ausführen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen <input type="checkbox"/> Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen <input type="checkbox"/> Betriebsanweisung erstellen
Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgungsbestätigung (Abbruch) weiterleiten <input type="checkbox"/> Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau) <input type="checkbox"/> Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Entsorgungsbestätigung (Abbruch) weiterleiten	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Entsorgung prüfen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben <input type="checkbox"/> Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	<input type="checkbox"/> Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	<input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren <input type="checkbox"/> Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen <input type="checkbox"/> Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren
Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen <input type="checkbox"/> Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Bautagebuchbericht (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> statische Begleitung umsetzen <input type="checkbox"/> Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

1.6.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch)		-
Bauvorhabendaten (Besprechung ex-	Bauvorhabendaten (Besprechung ex-		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
tern Abbruch) erfassen	tern Abbruch)		
Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch)		-
Teilnehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung extern Abbruch)		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch)		-

1.6.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-


1.6.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) extern			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) extern			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) extern	Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) extern	Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) extern	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-

1.6.1.d Teilnehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) extern			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) extern			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) extern			
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) extern	Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) extern	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) extern	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-

1.6.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) extern			
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) extern			
Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) extern			
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) extern			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) extern			
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) extern			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) extern			
Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) extern			
Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern			
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) extern			
Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) extern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) extern	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) extern	Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) extern	Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) extern	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) extern	Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern	Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern	Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) extern	Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) extern	Freigegeben	-

1.6.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau) erfassen			
Bauvorhabendaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch) erstellen			
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen			
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau) erfassen	Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau)		-
Bauvorhabendaten (Besprechung intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruch) erfassen			
Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch) erstellen	Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch)		-
Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen	Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch)		-
Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen	Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch)		-

1.6.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-


1.6.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftraggebername (Rückbau)			
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftraggebername (Rückbau)	Auftraggebername (Rückbau)	Freigegeben	-
Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)	Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-


1.6.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) intern			
Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) intern			
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) intern	Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) intern	Besprechungsdatum (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) intern	Besprechungszeitraum (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-

1.6.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) intern			
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) intern			
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) intern			
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) intern	Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) intern	Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) intern	Anwesenheitszustand (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollverteilungsart (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-

1.6.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) intern			
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) intern			
Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) intern			
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) intern			
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) intern			
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) intern			
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) intern			
Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) intern			
Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern			
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) intern			
Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) intern			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) intern	Laufende Nummer Protokollposition (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) intern	Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) intern	Verweis auf zurückliegende Protokolle (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollbesprechungstext (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) intern	Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) intern	Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern	Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern	Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollerstelldatum (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-
Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) intern	Protokollführender (Rückbau) (Abbruch) intern	Freigegeben	-

1.6.3 Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen			
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen			
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen			
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)		-
Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)		-
Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)		-

1.6.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Abbruch)			
Poliername (Rückbau) (Abbruch)			
Baustellenname (Rückbau)			
Baustellenstraße (Rückbau)			
Baustellenort (Rückbau)			
Witterung (Rückbau) (Abbruch)			
Temperatur (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Abbruch)	Leistungsberichtsdatum (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Poliername (Rückbau) (Abbruch)	Poliername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Baustellenname (Rückbau)	Baustellenname (Rückbau)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenstraße (Rückbau)	Baustellenstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Baustellenort (Rückbau)	Baustellenort (Rückbau)	Freigegeben	-
Witterung (Rückbau) (Abbruch)	Witterung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Temperatur (Rückbau) (Abbruch)	Temperatur (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen

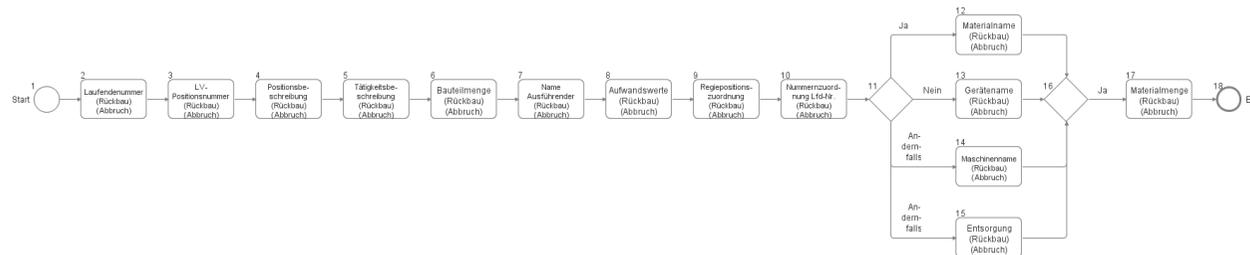


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch)			
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)			
Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch)			
Name Ausführender (Rückbau) (Abbruch)			
Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch)			
Regiepositions-zuordnung (Rückbau)			

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
(Abbruch)			
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Abbruch)			
Materialname (Rückbau) (Abbruch)			
Gerätename (Rückbau) (Abbruch)			
Maschinename (Rückbau) (Abbruch)			
Entsorgung (Rückbau) (Abbruch)			
Materialmenge (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch)	Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
LV-Positionsnummer (Rückbau) (Abbruch)	LV-Positionsnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Positionsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Positionsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch)	Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Name Ausführender (Rückbau) (Abbruch)	Name Ausführender (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch)	Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Abbruch)	Regiepositionszuordnung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Abbruch)	Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Materialname (Rückbau) (Abbruch)	Materialname (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Gerätename (Rückbau) (Abbruch)	Gerätename (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Maschinename (Rückbau) (Abbruch)	Maschinename (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Entsorgung (Rückbau) (Abbruch)	Entsorgung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Materialmenge (Rückbau) (Abbruch)	Materialmenge (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch)			
Datum (Rückbau) (Abbruch)			
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Abbruch)			
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch)	Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Datum (Rückbau) (Abbruch)	Datum (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Abbruch)	Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Abbruch)	Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.4 Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen			
Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen			
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen			
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen			
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch)		-
Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch)		-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
bau) (Abbruch) erfassen	bau) (Abbruch)		
Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch)		-
Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch)		-
Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen	Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch)		-

1.6.4.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Unternehmername (Rückbau) (Abbruch)			
Unternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)			
Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch)			
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Unternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmerstraße (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmertelefonnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmerfaxnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau) (Abbruch)	Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.4.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauherrenname (Rückbau)			
Objektstraße (Rückbau)			
Objektort (Rückbau)			
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Abbruch)			
Bautagebuchdatum (Rückbau) (Abbruch)			
Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Abbruch)			
Bautagebuchtemperatur (Rückbau) (Abbruch)			
Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Abbruch)			
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauherrenname (Rückbau)	Bauherrenname (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektstraße (Rückbau)	Objektstraße (Rückbau)	Freigegeben	-
Objektort (Rückbau)	Objektort (Rückbau)	Freigegeben	-
Bautagebuchnummer (Rückbau) (Abbruch)	Bautagebuchnummer (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Bautagebuchdatum (Rückbau) (Abbruch)	Bautagebuchdatum (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Abbruch)	Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Bautagebuchtemperatur (Rückbau) (Abbruch)	Bautagebuchtemperatur (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Abbruch)	Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Abbruch)	Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.6.4.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Abbruch)			
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Abbruch)			
Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch)			
Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch)			
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)			
Außervertragliches (Rückbau) (Abbruch)			
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Abbruch)	LV-Positionsnummervverweis (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Abbruch)	LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch)	Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch)	Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Außervertragliches (Rückbau) (Abbruch)	Außervertragliches (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Sonstiges (Rückbau) (Abbruch)	Sonstiges (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-


1.6.4.d Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufsteller (Rückbau) (Abbruch)			
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Abbruch)			
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufsteller (Rückbau) (Abbruch)	Aufsteller (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Aufstellungsdatum (Rückbau) (Abbruch)	Aufstellungsdatum (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Abbruch)	Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-


1.6.4.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfername (Rückbau) (Abbruch)			
Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch)			
Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch)			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Prüfername (Rückbau) (Abbruch)	Prüfername (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch)	Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-
Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch)	Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch)	Freigegeben	-

1.7 Rückbauausführung (Abbruch) fertigstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Entsorgungsbestätigung (Abbruch) weiterleiten
	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
	Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Geräte- und Personalverteilung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Stundenlohnbericht (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen
Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Rückbau Auftrag Femdleistung AV	1. Bearbeitung	NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau BE-Plan (fortschreiben)	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) fortschreiben
	Rückbau Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) aufstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
	Arbeitskalkulation (Rückbau)	1. Bearbeitung	Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
	Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Entsorgungsbestätigung (Abbruch) weiterleiten
	Entsorgungsnachweisprüfprotokoll	Freigegeben	Entsorgung prüfen
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Kick-Off (Rückbau) Protokoll	1. Bearbeitung	Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Aufmaßprüfprotokoll	Freigegeben	Aufmaßprüfung
	Vertragsunterlagen (Rückbau)	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen (Rückbau) zusammenstellen
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Rechnungsprüfprotokoll	Freigegeben	Rechnungsprüfung
	Zahlungsanweisung (Rückbau)	Freigegeben	Zahlung anweisen
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen	Terminplan (Rückbau)	1. Bearbeitung	Termincontrolling (Rückbau) fortführen
	Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau)	Freigegeben	Jour-Fix Besprechungen (Rückbau) (extern) durchführen
	Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen
	Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch)	1. Bearbeitung	Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen
	Bautagebuchbericht (Rückbau)	Freigegeben	Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Rückbau Detailterminplan	1. Bearbeitung	Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Kostenmeldung (Rückbau) fortschreiben	Kostenmeldung (Rückbau)	3. Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Nachkalkulation (Rückbau) erstellen <input type="checkbox"/> Analyseabschlussgespräch (Rückbau) führen
Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Aufmaß (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Aufmaßprüfung
Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch) erstellen	Abschlagsrechnung (Rückbau) (Abbruch)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfung <input type="checkbox"/> Zahlung anweisen
Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) führen	Rechnungsausgangsbuch (Rückbau)	3. Bearbeitung	-
Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) erstellen	Fertigstellungsmitteilung (Rückbau)	Geteilt	<input type="checkbox"/> Abnahme durchführen <input type="checkbox"/> Schluss Beweissicherungsgutachten erstellen <input type="checkbox"/> Fotodocumentaion erstellen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) durchführen <input type="checkbox"/> Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) durchführen <input type="checkbox"/> Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau) zurückfordern <input type="checkbox"/> Abnahme (Rückbau)

